

2026 AX사업실 운영계획

기준일 2026-10-05 작성 · AX사업실

대외비 · 내부용

01 미션

초안 · 확인 필요

AX사업실 미션

VR 제작에서 체험 마케팅으로

공간과 브랜드의 체험 마케팅을 기획부터 납품까지 한 번에 책임지는 팀

이전

VR 프로젝트 중심 수주

분양 사이버 모델하우스 · 단위세대 VR

→

1~3분기 실제 수주

체험 마케팅 전 영역

VR · XR

오티에르 반포 XR · 송도 G5 · 해모로 집부 솔루션

하드웨어

거제 상동 투명 LED DX (본 계약 + 추가 2건)

개발

GS 옵션몰 고도화 · 비스포크 시뮬레이터 유지보수 · 한동대 XROO

CG · 영상

올리브영 티커영상 · 데이코 마케팅 영상 · 삼표 갤러리 AI영상

전시 · 콘텐츠

신화갤러리 전시 · 삼성 디자인센터 · 교보문고 팝업스토어 · 국립생태원

02 조직 체계 — AX사업실

총 10명 · 3개 부서



03 팀 운영 — 운영 목표 · 역할 · 운영 원칙

초안 · 확인 필요

— 운영 목표 — 합쳐진 10명을 어떻게 운용하나

4분기 매출 목표(11.62억)를 채우면 프로덕션 1인당 약 8.5건(3분기 5.3건)을 맡는다. 지금처럼 직접 제작만 해서는 감당할 수 없어, 제작 인원의 역할부터 바꾼다.

1

제작자에서 PM으로

프로덕션 4명은 각자 담당 프로젝트의 PM이 된다. 품질을 좌우하는 핵심 작업만 직접 하고, 표준 물량은 외주에 맡겨 일정 · 품질 · 원가를 관리한다.

지표 · 1인당 동시 PM 건수 · 외주 관리 건수

2

프로젝트 단위 팀

수주 건마다 세일즈 1명 + PM 1명(+ 필요 시 지원)으로 팀을 짠다. 착수부터 납품 · 추가 제안까지 같은 팀이 끝까지 맡아 인계 손실을 없앤다.

지표 · 착수 인계서 작성률 100%

3

건설 · 비건설 교차 배정

전 인원을 건설 · 비건설 구분 없이 배정해 누구나 두 영역을 수행할 수 있게 만든다. 지원 인원은 제작 지원과 함께 기획 작업까지 맡는다.

지표 · 인원별 두 영역 수행 경험

4

가동률 기준 외주 전환

주간 리소스 보드로 인원별 일정을 공개한다. 내부 일정이 기준을 넘으면 새 건은 바로 외주로 돌려, 수주가 몰려도 납기를 지킨다.

지표 · 내부 가동률 기준선 (확인 필요)

— 역할 · 업무 흐름

제안 · 수주

세일즈기획 · 건적 단계에서 예상 이익 확인

→

착수 · 제작 · 검수 · 납품

프로덕션 · 내부 제작 + 외주 발주

→

추가 제안

세일즈기획 · 납품 현장에서 다음 건

지원 — 제안 단계의 기획 자료 · 시연 영상, 수행 단계의 개발 · 영상 · 하드웨어를 양쪽에 공급

세일즈기획 (고객대응) Charles · Lucia · Anna

Charles — 실 총괄 · 1억 이상 대형 HW 결합 건 · 해모로(HJ) · 위너케이

Lucia — 비건설 계정(삼성전자 2027) · 반도건설

Anna — 동부건설 다음 현장 · GS 옵션몰 · 소요한남(브릭스)

견적 전에 **외주 원가**를 먼저 받아 **예상 이익**을 확인한 뒤 가격을 낸다

프로덕션 (PM, 제작) James 외 3명

모든 수주 건의 **PM**과 **최종 검수**를 맡는다 — 외주 건도 품질 책임은 내부

건별로 **내부 제작 / 외주**를 배정하고, 외주 발주의 단일 창구가 된다

완료 시 **실제 원가 · 이익**을 정산해 월간 리뷰에 보고

지원 (개발, 영상, 하드웨어) Rhea · Sianu · Seok

제안서용 **기획 자료 · 시연 영상** 제작으로 수주 단계 지원

옵션몰 · 집부 솔루션 개발 — **외주가 대신하기 어려운 핵심 영역**

대형 HW 건의 사양 정리와 **설치 협력사** 관리

— 운영 원칙

매주 맞춘다

주간 회의로 수주 현황과 제작 일정을 함께 본다

이익으로 판단한다

예상 이익이 기준에 못 미치는 건은 실장이 결정한다

외주 창구는 하나

외주 발주와 관리는 프로덕션이 맡는다

※ 담당 배정은 3분기 실제 수주 담당 기준이다.

04 4분기 매출 목표

연간 30억 · 건설 + 비건설 통합

연간 목표

30억

건설 + 비건설 통합

1~3분기 누적

18.38억

달성률 61%

4분기 목표

11.62억

월 3.87억 · 3분기(7.20억)의 1.6배

2·3분기 평균(7.25억)만 유지하면 연간 25.6억으로 **4.37억이 모자란다**. 이 차이는 **1억 이상 대형 건 3건**(거제 상동 1.40억 수준)으로 메운다. 실적 근거는 부록 A·B에 있다. 월 기준으로는 매달 3.87억 — 3분기 최고였던 9월(3.25억)보다 높은 수준을 10~12월 석 달 연속 내야 한다.

4분기 목표 구성	금액	연간 누적	채우는 방법
기본 지금 수준 유지	7.25억	25.63억	신규 고객사 다음 현장·협의 건 클로징·비건설 정기 건 (우선순위 1·3·4)
추가 대형 건	4.37억	30.00억	1억 이상 HW 결합 건 약 3건·삼성전자 2027 상반기 선확보 (우선순위 2·4)
목표 4분기 합계	11.62억	30.00억	10월·11월·12월 각 약 3.9억

05 외주 활용과 매출총이익 관리

제안·실제 원가율 확인 필요

4분기에 필요한 수주 건수

약 34건

11.62억 ÷ 3분기 건당 평균 3,431만

3분기 수주

21건

프로덕션 1인당 약 5.3건

4분기 프로덕션 1인당

약 8.5건

3분기 수주분 납품과 겹침

목표를 채우면 수행할 일이 3분기의 1.6배가 되고, 3분기에 수주한 21건의 납품도 겹친다. **내부 인력만으로는 다 할 수 없다**. 그래서 수주를 줄이지 않고, 광고대행사처럼 내부는 기획·PM·검수를 쥐고 제작 물량은 외주 협력사로 넓힌다. 대신 건마다 남는 이익을 관리해야 한다.

● 내부에서 하는 일 — 차별화·품질 책임


● 고객 대응·기획·PM — 고객 관계와 범위 관리는 넘기지 않는다

● 외주로 맡기는 일 — 표준·반복·물량

- **옵선물·집부 솔루션 개발** — 견적 엔진·데이터 모델 등 외주 업체가 쉽게 복제하지 못하는 영역
- **AI 영상 등 표준화된 자체 제작물** — 반복 제작으로 원가를 낮출 수 있는 영역
- **최종 검수·납품** — 외주 건도 품질 책임은 내부

- **표준 유닛 VR 모델링·렌더링** — 외주 업체가 많고 단가가 평준화된 영역
- **CG·영상 촬영·편집** 등 물량이 많은 작업
- **투명 LED·키오스크 설치·시공** — 장비 매입과 현장 설치
- 내부 일정이 꽉 찬 시기의 **초과 물량**

— 매출총이익 관리 구조

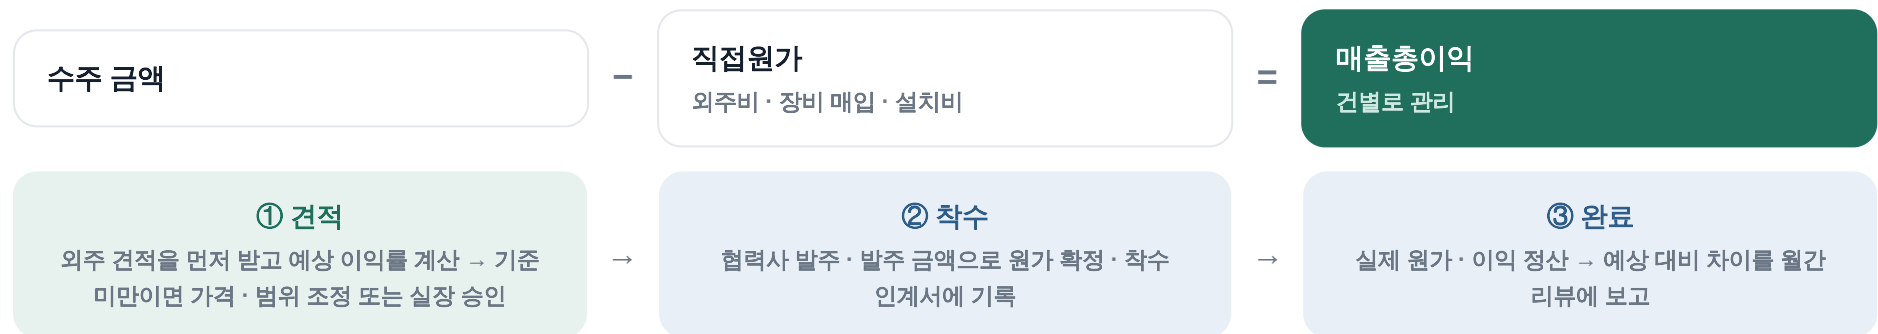

상품 유형	수행 방식	기준 이익률
옵선물·솔루션 개발	내부 중심	확인 필요
VR 사이버 모델하우스	외주 제작 + 내부 PM·검수	확인 필요
HW 결합 (투명 LED 등)	장비 매입 + 설치 외주	확인 필요
영상·AI 영상	내부 + 외주	확인 필요

4분기 이익률	매출총이익 (11.62억 기준)
30%	3.49억
40%	4.65억
50%	5.81억

이익률이 10%p 달라지면 같은 매출에서 매출총이익이 **1.16억** 달라진다. 외주를 늘릴수록 수주 단계의 이익 확인이 중요한 이유다.

HW 결합은 금액이 크지만 장비 매입 비중 때문에 이익률은 낮을 수 있다(추정). 금액과 이익률을 함께 본다.

● 협력사 운영 원칙

- 모델링 · 영상 · HW 설치 분야별로 협력사를 2곳 이상 확보해 일정과 단가를 비교한다
- 반복 작업은 단가 계약으로 원가를 미리 고정한다
- 외주 대금은 고객 수금 일정에 맞춰 단계별로 지급해 현금 부담을 줄인다
- 협력사별 품질 · 납기를 평가해 분기마다 다시 고른다

※ 상품별 실제 원가율과 외주 비중 데이터가 없어 기준 이익률은 비워 두었다. 1~3분기 건별 원가 자료를 받으면 상품별 기준과 4분기 매출총이익 목표를 채운다.

06 4분기 실행 전략

세일즈 방향성 · 우선순위 · 상품 전략 · 마케팅

— 세일즈 방향성

1

체험 마케팅 원스톱 제안

한 고객에게 VR · 하드웨어 · 개발 · CG · 영상을 묶어서 제안한다. 단품 VR 건적으로 끝내지 않는다.

지표 · 2개 이상 영역 결합 제안 비중

2

수주는 줄이지 않는다

내부 인력이 모자라도 수주 범위를 인력에 맞추지 않는다. 광고대행사처럼 외주 협력사로 수행 범위를 넓힌다.

지표 · 분기 수주 건수 · 금액

3

이익을 확인하고 수주

견적 전에 외주 원가를 받아 예상 매출총이익을 확인한다. 기준에 못 미치면 가격 · 범위를 조정하거나 실장 승인을 받는다.

지표 · 견적 단계 이익 확인률 100%

4

반복 수주 고객 만들기

납품 현장에서 다음 건을 제안해 한 번 거래한 고객이 다시 맡기게 한다. 동문 · 동부 · HJ중공업이 이미 보여준 방식이다.

지표 · 재수주 고객 수 · 납품 후 추가 제안 건수

— 4분기 우선순위

1

3분기 신규 고객사에서 다음 현장 따내기

동부건설 · HJ중공업(해모로)은 이미 2개 현장을 연달아 맡겼고, 상반기 동문건설도 같은 방식으로 3개 현장을 수주했다. 동부 · HJ · 반도 · 위너케이의 **4분기 분양 예정 현장**을 먼저 찾아 선제 제안한다.

대상 4개사 · 3분기 3.81억

2

1억 이상 대형 건 되살리기

4분기 분양 대단지엔 **투명 LED · 키오스크 결합 패키지**를 모델하우스 협의 단계부터 제안한다. 대상 후보는 성남 상대원2(DL, 10월 · 1,866세대), 포항 장성동 · 대구 노원2 · 광주 양동3(11월), 래미안 마크더스 위트(삼성물산, 12월)다.

목표 달성 = 대형 건 3건 · 상태 확인 필요

3

멈춘 협의 건 정리

6월 협의 9건 중 남은 8건(송도 G5 옵션물 추가 · 계룡 평택/천안 · 삼성물산 목동 · 이편한세상 당산 · 포레나 평택/창원 · SM그룹 인천)을 **10월 중 진행 / 연기 / 종료로 판정**한다. 진행 중인 건만 4분기 클로징 목록에 남긴다.

10월 판정 · 8건 액면 5.59억

4

비건설 계정 넓히기

삼성 디자인센터는 상반기(4월) · 하반기(9월) 두 번 계약됐다. **2027년 상반기 건을 4분기 안에 미리 확보**하고, 올리브영 티커영상처럼 정기 정산되는 건은 유지한다. 동시에 새 비건설 고객을 늘려 삼성전자 비중을 낮춘다.

삼성 비중 44% → 분산

— 상품 전략 — 6월 수립, 4분기에도 이어서 진행

※ 아래 사업지 목록은 6월 기준으로 뽑은 것이다. 거제 옥포동은 8월에 수주(8,490만원)했고, 나머지는 4분기 제안 전에 상태를 다시 확인해야 한다.

A

하이브리드 옵션물

분양 때 만든 VR을 **옵션행사 단계에서 그대로 다시 활용**하는 방식. 분양에는 핵심 타입만 VR로 만들고, 옵션행사에는 그 VR을 연계해 나머지 타입을 목록형으로 더해 **고객이 직접 옵션을 고르고 견적까지 확인**한다.



핵심 효과 — 한 번 만든 VR을 분양·옵션행사 두 단계에서 **활용** → 고객 입장에서 제작비 절감, 같은 콘텐츠를 더 다양하게 써서 **일회성으로 소모되지** 않음.

💡 영업 기회 — 분양 VR이 있고 **옵션행사가 남은 사업지**는 적은 추가 비용으로 옵션몰을 엮는 **추가 제안**이 가능. (진행 중인 사업지를 점검해 옵션몰 제안 대상으로 리스트화)

참고 예시 · 송도 G5 : 분양 VR 5,800만 → 옵션 솔루션 추가로 9,400만 / GS 옵션몰 · 엘리프 세종 옵션행사

▶ 옵션몰 솔루션 데모 보기

옵션몰 추가 제안 가능 사업지 (예상 견적)

분양 VR이 있거나 **분양 예정인** 사업지 중 옵션몰을 제안할 수 있는 곳. 사업지당 개발비 약 **3,000만원** 가정(확인 필요).

사업지	고객사	상태	옵션몰 추가(예상)
포레나힐스테이트진주	(주)한화	분양 VR 진행 중 → 옵션몰 추가 제안	30,000,000
오산세교2 A-5BL	우미건설	분양 VR 진행 중 → 옵션몰 추가 제안	30,000,000
포레나평택	(주)한화	하반기 분양예정 · 옵션몰 결합 제안	30,000,000

사업지	고객사	상태	옵션물 추가(예상)
포레나창원	(주)한화	하반기 분양예정 · 옵션물 결합 제안	30,000,000
이천 가좌2지구 공동주택	동문건설	하반기 분양예정 · 옵션물 결합 제안	30,000,000
KTX울산역 복합특화단지 A3블록	동문건설	하반기 분양예정 · 옵션물 결합 제안	30,000,000
대구 노원2재개발	포스코이앤씨	분양예정 · G5 성과 후 확대 기대	30,000,000
포항 장성동 재개발	포스코이앤씨	분양예정 · G5 성과 후 확대 기대	30,000,000
광주 양동3구역 재개발	포스코이앤씨	분양예정 · G5 성과 후 확대 기대	30,000,000
합계 (9개 사업지)			270,000,000

※ 사업지당 3,000만원 = 계룡 사례 기준 개발비 2,500만원 + 콘텐츠 제작비 500만원을 일괄 적용한 추정치. 실제 프로젝트 진행 시 타입 수·범위에 따라 변동될 수 있음.

B 하드웨어 결합 상품 판매

단순히 하드웨어를 파는 게 아니라, **하드웨어 + VR + 체험 마케팅 서비스**를 하나로 묶어 제안한다. 모델하우스를 '보는 곳'에서 '체험하는 곳'으로 바꿔, 1건당 금액을 콘텐츠 단독 대비 크게 끌어올린다.

하드웨어

투명 LED · 키오스크 · 사이니지 등
(다양한 HW 리서치 · 발굴)

+

VR 콘텐츠 결합

커뮤니티 · 유닛 VR을 하드웨어에 연동

+

체험 마케팅 서비스

현장 체험형 연출 등 특별 제안

↓ 단순 하드웨어 납품이 아닌 '**체험 마케팅 솔루션**'으로 제안

핵심 효과 — 콘텐츠 단독 4~6천만원 → 하드웨어 결합 시 **1.4억원+**. 1건당 금액이 3배 이상으로.

대상 — 모델하우스 비용 산정을 진행하는 **시행사** (예: 한국토지신탁 · 신영 · 포스코 등).

진입 시점 — 모델하우스 건립 협의 단계부터 올림플래닛이 들어가 하드웨어를 제안 → 설계 초기에 반영돼 채택률이 높아짐.

※ **하드웨어 라인업 확장** — 사이너지에 국한하지 않고 다양한 하드웨어를 지속 리서치·발굴해 제안. 올림의 강점은 하드웨어 단독 판매가 아니라, **하드웨어 + 콘텐츠**를 결합해 고부가가치 체험 솔루션으로 만드는 데 있음.

참고 예시 · 거제 상동 : 하드웨어 + 커뮤니티 영상 5,600만 → 사이너지 추가 결합으로 2.06억 (3.7배)

하드웨어 결합 제안 타겟 — 9~12월 분양 예정 (예상 견적)

9~12월 분양 예정 대단지 중 모델하우스 HW 결합이 가능한 사업지. 거제 상동 사례 기준 투명 LED 결합 시 콘텐츠 단독 대비 **3~5배** deal size 확대(확인 필요).

사업지	시공사·발주처	일반분양	접점 · 분양시기	제안 HW	예상 견적
거제 옥포동 공동주택	현대ENG	1,963	거제상동 LED 레퍼런스 · 9월	사이너지 + VR 결합	50,000,000
디에이치 클라스트(반포)	현대건설	1,803	오티에르 반포 XR 레퍼런스 · 9월	사이너지 + VR 결합	50,000,000
중계본동(백사마을)	GS건설	1,335	GS 옵션몰 기존 고객 · 9월	사이너지 + VR 결합	50,000,000
대전 도마변동 3구역	파트너 채널(주한사)	2,364	분양마케팅그룹 경유 · 9월	사이너지 + VR 결합	50,000,000
성남 상대원2구역	DL이앤씨	1,866	이편한세상 당산 협의 중 · 10월	사이너지 + VR 결합	50,000,000

사업지	시공사·발주처	일반분양	접점·분양시기	제안 HW	예상 견적
포항 장성동 재개발	파트너 채널(당사)	1,935	분양마케팅그룹 경유 · 11월	사이니지 + VR 결합	50,000,000
대구 노원2재개발	파트너 채널(당사)	1,035	분양마케팅그룹 경유 · 11월	사이니지 + VR 결합	50,000,000
광주 양동3구역 재개발	파트너 채널(당사)	781	분양마케팅그룹 경유 · 11월	사이니지 + VR 결합	50,000,000
합계 (8개 사업지)					400,000,000

※ 사업지당 5,000만원 = 거제 상동 사이니지 추가건(투명 LED 2면 + 설치) 기준 일괄 추정치. 투명 LED 수량·사양에 따라 변동(확인 필요). 거제 옥포동·디에이치 클래스트는 대형 HW deal로 확대 시 1.4억+까지 가능.

C AI 영상 적극 도입

분양을 위해 어차피 제작하는 CG를 활용해 AI 영상을 만들어 판매한다. 추가 촬영·모델링 없이 보유 CG 기반이라 제작 부담이 작고, Full 3D 건축영상 대비 저가라 가격 경쟁력이 높다.

분양용 CG

분양 위해 어차피 제작
(추가 비용 없이 보유)



AI 영상화

보유 CG를 AI로 영상 제작



추가 매출

건당 1,500 ~ 2,000만원

핵심 효과 — 이미 만든 CG를 재활용해 제작 부담 최소화. Full 3D 건축영상(고가) 대비 저가라 도입 문턱이 낮음.

대상 — CG만 진행하고 영상은 진행하지 않은 사업지. 기존 진행 사업지를 전수 점검해 AI 영상 추가 제안(대상 선별 필요 · 확인 필요).

참고 예시 · 코오롱 상인천 · 코오롱 엄궁 : 분양 CG를 활용한 AI 영상 제작

AI 영상 추가 제안 가능 사업지 — 1,000세대 이상 대단지 (예상 견적)

분양 PJT 현황 + 시공사 공급계획 중 1,000세대 이상이면서 하반기 분양 예정인 사업지를 우리 관계 우선으로 선별. 컷수 많은 대단지 기준 사업지당 약 2,000만원 가정(확인 필요).

사업지	시공사·발주처	일반분양	접점 · 상태	AI 영상(예상)
거제 옥포동 공동주택	현대ENG	1,963	거제상동 LED 레퍼런스 인접 · 9월	20,000,000
디에이치 클래스트(반포)	현대건설	1,803	오티에르 반포 XR 레퍼런스 · 9월	20,000,000
중계본동(백사마을)	GS건설	1,335	GS 옵션몰 기존 고객 · 3분기	20,000,000
성남 상대원2구역	DL이앤씨	1,866	이편한세상 당산 협의 중 · 10월	20,000,000
천안 성정동	대우건설	1,438	신규 접점 · 7월 분양 임박	20,000,000
대전 도마변동 3구역	파트너 채널(주간사)	2,364	분양마케팅그룹 경유 · 9월	20,000,000
포항 장성동 재개발	파트너 채널(당사)	1,935	분양마케팅그룹 경유 · 11월	20,000,000
천안 대흥4구역 재개발	파트너 채널(당사)	2,050	분양마케팅그룹 경유 · 시기 미정	20,000,000
대구 노원2재개발	파트너 채널(당사)	1,035	분양마케팅그룹 경유 · 11월	20,000,000

사업지	시공사·발주처	일반분양	접점 · 상태	AI 영상(예상)
광주 양동3구역 재개발	파트너 채널(당사)	781	분양마케팅그룹 경유 · 11월	20,000,000
합계 (10개 사업지)				200,000,000

※ 사업지당 2,000만원 = AI 영상 실판매 사례(1,500~2,000만원) 상단 적용 추정치. 컷수·분량 확정 후 제작팀 협의로 변동. 검단레이크파크·분당 느티마을 등 이미 분양 완료된 1,000세대+ 단지는 AI 영상 대신 옵션물 전환 대상으로 분류.

D 모델하우스 사인업체 컨소시엄

모델하우스 사인·인테리어 업체와 컨소시엄을 구성해 **HW 결합 패키지**를 사인업체의 영업망을 통해 확대한다. 사인업체는 업체당 모델하우스 5개 이상을 연간 담당하므로, 채널 파트너십 1곳이 곧 5개+ 신규 현장 파이프라인이 된다.

사인업체 영업망

업체당 5개+ 현장 연간 진행
1개 현장 평균 1~4억 규모 (확인 필요)

+

집부 HW 결합 패키지

사이니지 + VR 콘텐츠
+ 체험 마케팅 서비스

=

채널 확장 · deal 규모화

직접 영업 외 채널 영업으로
단기 파이프라인 대규모 확대

핵심 효과 — 사인업체 1곳 파트너십 → 연간 5개+ 현장 × HW 결합 패키지. 직접 발굴 없이 채널을 통해 접점을 단기간에 수배로 확장할 수 있는 구조.

확장 시나리오 — 기존 상품(하이브리드 옵션물) 20~30억 + 사인업체 컨소시엄을 통한 하드웨어 결합 확대 15~25억 → **총 매출 목표 40~60억** 도전 가능 (확인 필요 · 파트너 수·계약 조건에 따라 변동).

※ 사인업체 현장 수·단가는 추정치(확인 필요). 컨소시엄 구성 시 수익 배분·브랜딩 정책 결정 필요. 적합한 파트너사 리서치·접선부터 시작.

아직 안 판 영역 : 옵션물 고객에게 **시공 단계 · 입주 후 관리(상담) 단계**까지 추가 판매(분양→입주 전 과정을 묶어 이탈 방지).

— 신규 고객 만들기 — 마케팅 (별도 병행)

중기 체질 개선 과제로, 4분기 매출에 직접 기여하는 몫은 작다.

★ 상반기 최고 효과 포럼 — 의사결정자 대면 접점

포럼 참석 기업

16개

건설사·시행사·대행사 의사결정자

세일즈 미팅 규모

3억

포럼 접점 → 실제 제안으로 연결

연간 계약 추진 중

2곳

현대엔지니어링 · 우미건설

4분기 방향 — 건설 팝업 담당자 / 모델하우스 브랜딩 협업으로 포럼 재진행. 단발성이 아닌 반기 1회 이상 정례화 필요.

A

포럼 정례화

건설·시행·대행사 의사결정자 대면 포럼을 반기 1회 이상 진행. 상반기 1회로 3억 세일즈 미팅·연간 계약 2곳 확보 → 가장 직접적인 신규 고객 창구.

반기 1회 이상 · 건설 팝업/브랜딩 협업

B

홈페이지 개선 중심 창구

zipview.ai를 납품 실적·상품 소개·문의 양식(문의 고객 정보 수집) 중심으로 개편. 도입사례 업로드로 방문자를 제안 기회로 전환.

도입사례 업로드 최우선

C

뉴스레터

관계자 DB 1,500명 보유. 오픈율 **35.8%** · 클릭률 **16.4%**로 업계 평균 대비 양호하나, 현재 **매출 전환 0회**. 고객 핵심 키워드 + 도입사례를 연결한 콘텐츠로 CTA 클릭 → 문의 전환 개선이 과제.

오픈율 35.8% · 클릭 16.4% · 전환 개선 필요

D

유튜브

6월 조회수 7,300회 · 평균 참여시간 8초 · 매출 전환 0회. 현재는 포트폴리오 용도로만 활용 중. 홍보용 편집 재제작으로 체류 시간·CTA 연결을 개선해야 영업 신뢰 자료로서 효과 발휘.

조회 7,300 · 체류 8초 → 홍보 편집 재제작 필요

07 위험 & 지원 요청

● 위험

- **대형 건 공백** — 3분기 건설 1억 이상 0건. 4분기 목표 중 4.37억은 대형 건 뒀이라, 이 건들이 없으면 30억은 어렵다
- **비건설 집중** — 3분기 비건설의 83%가 삼성전자. 2027 계약 시점이 늦어지면 공백이 생긴다
- **제작 부하** — 3분기 21건 납품과 4분기 약 34건 착수가 겹친다 → 외주로 수행 범위 확대
- **외주 확대의 부작용** — 품질 · 납기 · 이익률 관리가 어려워진다 → 내부 검수 · 견적 단계 이익 확인
- **월 런레이트** — 매달 3.87억이 필요해 3분기 최고인 9월(3.25억)보다 높다

● 결정 · 지원 요청

- 4분기 목표 11.62억의 **월별 · 담당별 배분 합의**
- 분야별 **외주 협력사 풀 구축 · 단가 계약 승인** (모델링 · 영상 · HW 설치)
- 건별 이익률 **기준 확정** (상품 유형별)
- 대형 건 · 삼성전자 2027 협의에 **임원 동행**
- 지원 조직의 **개발 · 영상 우선순위 합의** (대형 건 우선)

결론 · 종합

AX사업실은 VR 제작을 넘어 **체험 마케팅 전 영역**을 수주하는 팀으로 바뀌었다. 1~3분기 누적 수주는 **18.38억(49건)**이다. 2·3분기 연속 **7억대**를 지켰고, 3분기에는 **새로 연 고객사(67%)**와 **세 명이 고르게 나눠 맡는 영업 구조**가 실적을 만들었다. 반면 **건설 1억 이상 대형 건**이 끊기고 **건당 단가가 내려갔으며**, 비건설은 삼성전자에 집중돼 있다. 4분기에는 **신규 고객사의 다음 현장 수주 · 대형 HW 결합 건 회복 · 멈춘 협의 건 정리 · 비건설 계정 확장**으로 **건설 + 비건설 통합 연간 목표 30억**을 달성한다. AX사업실은 **일은 최대한 수주하고, 내부는 기획 · PM · 검수를 쥐고 제작 물량은 외주로 넓히되 건별 매출총이익으로 관리한다**. 이를 위한 4분기 목표는 **11.62억**이며, 지금 수준(7.25억)에 **1억 이상 대형 건 3건**을 더해야 채울 수 있다.

부록 4분기 목표의 근거가 된 1~3분기 실적과 분석

부록 A 1~3분기 실적

계약일 기준 · 분기 막대를 누르면 상세

1~3분기 누적 수주

18.38억

49건 · 연간 목표 30억의 61%

3분기 수주

7.20억


21건 · 2분기 7.30억과 같은 수준 유지

사업 구분 (누적)

건설 12.63억

비건설 5.75억 · 건설 69% : 비건설 31%

■ 건설 ■ 비건설

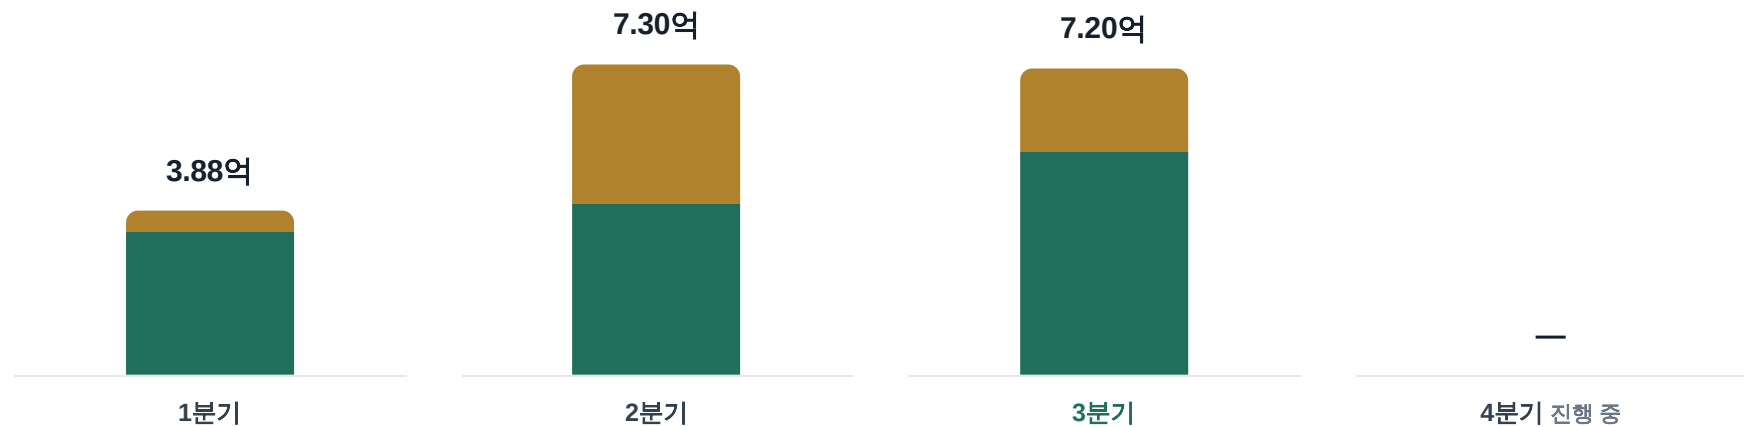

1분기 · 13건

건설 3.37억 · 비건설 0.51억 · 합계 387,810,364원

월	구분	프로젝트	고객사	담당	계약금액(원)
1월	건설	오티에르 반포 XR 솔루션	포스코이앤씨	Charles	20,200,000
1월	건설	포레나 상인천 재건축_추가 XR 통합 솔루션	(주)한화	Charles	1,350,000
1월	비건설	교보문고 갤럭시북6 팝업스토어 DX 솔루션	메이데이파트너스	Charles	12,000,000
1월	건설	동문_용인고림2지구 공동주택	동문건설(주)	Charles	39,000,000
1월	비건설	한수원 건식저장시설 콘텐츠 운영	한국능률협회컨설팅	Lucia	10,000,000
2월	건설	동문_천안삼룡동 공동주택	동문건설(주)	Charles	63,636,364
2월	비건설	ABC 승무원아카데미 교육솔루션	(주)에이비씨에어	Lucia	25,000,000
3월	건설	포레나힐스테이트진주	(주)한화	Anna	57,600,000
3월	비건설	KT&G 릴 미니멀리움 영상	키예노	Lucia	4,000,000
3월	건설	송도 G5	포애드원	Charles	58,000,000
3월	건설	거제 상동 2지구 투명 LED DX 솔루션_추가	한국토지신탁	Charles	55,024,000
3월	건설	등촌역 펜타아르테	(주)지존애드	Charles	6,000,000
3월	건설	엘리프 세종 스마트시티 옵션 행사 DX 솔루션	계룡건설	Charles	36,000,000

2분기 · 15건

건설 4.02억 · 비건설 3.28억 · 합계 730,064,464원

월	구분	프로젝트	고객사	담당	계약금액(원)
4월	건설	거제 상동 2지구 투명 LED DX 솔루션	한국토지신탁	Charles	140,456,000
4월	건설	동문_장승배기역 공동주택	동문건설(주)	Charles	80,000,000
4월	비건설	삼성 디자인센터 상반기	삼성전자	Lucia	92,500,000
4월	건설	거제 상동 2지구 투명 LED DX 솔루션_2차 추가	한국토지신탁	Charles	10,300,000
4월	건설	송도 G5 추가	포애드원	Charles	36,000,000
4월	건설	소요한남	브릭스인베스트먼트	Anna	40,000,000
4월	건설	전라남도 함안 주상복합	주식회사 더시프트	Charles	12,000,000
5월	비건설	올리브영 티커영상 정산 1~4월	에스큐브	Charles	15,882,000
5월	건설	오산세교2 A-5BL 공공지원민간임대주택	우미건설	Charles	24,000,000
5월	비건설	한동대학교 XROO 연간구독	한동대학	Lucia	1,090,909
5월	비건설	올리브영 티커영상 정산 5~6월	에스큐브	Charles	5,280,000
6월	비건설	신화갤러리 전시 솔루션	신화갤러리	Jin	150,000,000
6월	비건설	영남대 입찰 시연영상	제이솔루션	Jin	8,000,000
6월	비건설	트립네스트 관광바우처	(주)트립네스트	Lucia	55,555,555
6월	건설	전주 삼천주공3 재건축	삼천주공3 재건축	Charles	59,000,000

3분기 · 21건

건설 5.25억 · 비건설 1.96억 · 합계 720,493,636원

월	구분	프로젝트	고객사	담당	계약금액(원)
7월	건설	오산세교2 A-5BL 공공지원민간임대주택 층별조망	우미건설	Charles	17,000,000
7월	건설	GS 옵션몰 고도화	GS건설	Anna	15,000,000
7월	건설	트리븐 서산	디아트픽셀	Anna	8,000,000
7월	비건설	국립생태원 추가 콘텐츠	국립생태원	Lucia	26,363,636
7월	건설	동부건설 광고	동부건설	Anna	74,200,000
7월	비건설	올리브영 티커영상 정산 7~8월	에스큐브	Charles	6,150,000
8월	비건설	삼성전자 비스포크 시뮬레이터 유지보수	삼성전자	Charles	12,650,000
8월	건설	강릉 아테라 XR 솔루션	크리에이티브지니	Anna	12,000,000
8월	건설	동부건설 춘천 효자동	동부건설	Anna	83,100,000
8월	건설	포레나 천안아산 수정	(주)한화	Charles	18,750,000
8월	건설	거제시 옥포동 공동주택	위너케이	Charles	84,900,000
8월	건설	해모로 서대신 4구역 집류 솔루션	애드펀치(HJ중공업)	Charles	32,600,000
8월	건설	옵션몰 이미지형 리스트	모투스(GS건설)	Anna	5,000,000
9월	건설	계양신도시 AC3,4BL 카이브유보라	반도건설	Lucia	70,000,000
9월	비건설	삼성 디자인센터 하반기	삼성전자	Lucia	139,500,000
9월	건설	해모로 익산 영등주공1단지 집류 솔루션	애드펀치(HJ중공업)	Charles	36,500,000
9월	건설	검단 오류동 16호 공원 개발사업 콘텐츠	더시프트	Lucia	14,500,000

월	구분	프로젝트	고객사	담당	계약금액(원)
9월	비건설	데이코 마케팅 영상	삼성전자	Lucia	11,000,000
9월	건설	의정부역 펠리스타워	(주)클리프커뮤니케이션	Charles	22,000,000
9월	건설	소요한남 체험 솔루션	브릭스인베스트먼트	Anna	21,280,000
9월	건설	성수동 삼표산업 갤러리 AI영상	삼표산업	Charles	10,000,000

4분기 · 0건

10월 5일 기준 · 합계 0원

월	구분	프로젝트	고객사	담당	계약금액(원)
10월 5일 기준 수주 없음					

분기	건설	비건설	합계	건수	건당 평균	주요 건
1분기	3.37억	0.51억	3.88억	13건	2,983만	동문_천안삼룡동 공동주택 0.64억 · 송도 G5 0.58억
2분기	4.02억	3.28억	7.30억	15건	4,867만	신화갤러리 전시 솔루션 1.50억 · 거제 상동 2지구 투명 LED DX 솔루션 1.40억
3분기	5.25억	1.96억	7.20억	21건	3,431만	삼성 디자인센터 하반기 1.40억 · 거제시 옥포동 공동주택 0.85억
1~3분기 누적	12.63억	5.75억	18.38억	49건	3,752만	—

※ 출처: AX사업실 수주 실적표(계약서 작성 또는 작성 확정 후 실행 오더를 받은 프로젝트). 4분기는 10월 5일 기준 수주 없음.

성과

규모 유지, 월별로는 상승세

7월 1.47억 → 8월 2.49억 → 9월 3.25억

2분기(7.30억)와 같은 수준을 지키면서 건수는 15건 → 21건으로 늘었다. 분기 안에서 매달 수주가 커졌다.

성과

새로 연 고객사가 실적의 2/3

4.80억 · 3분기의 67%

상반기에 거래가 없던 고객사에서 나왔다. 동부건설 2개 현장 1.57억 · 위너케이(거제 옥포동) 0.85억 · 반도건설 0.70억 · HJ중공업 해모로 2개 현장 0.69억.

성과

한 사람에 몰리지 않는 구조

Charles 33% · Anna 30% · Lucia 36%

상반기에는 Charles 1인 비중이 60%였다. 3분기에는 세 명이 고르게 수주해 특정 담당자가 빠져도 실적이 버티는 구조가 됐다.

과제

대형 건이 없고 단가가 내려감

건설 건당 5,022만 → 3,280만

2분기에는 거제 상동 투명 LED(1.40억) 같은 1억 이상 건설 건이 있었지만, 3분기에는 0건이었다. 건수는 늘었는데 한 건의 크기가 작아졌다.

과제

6월 협의 9건 중 수주 1건

의정부역 펠리스타워 2,200만 (계획 5,300만)

6월에 잡아둔 협의 건은 대부분 수주로 이어지지 않았고, 3분기 실적은 새 고객에서 나왔다. 나머지 8건이 진행 중인지 종료됐는지 판정이 필요하다.

과제

비건설은 삼성전자 한 곳에 집중

3분기 비건설 1.96억 중 1.63억 (83%)

삼성 디자인센터 하반기(1.40억)가 대부분이다. 누적으로도 비건설 실적의 44%가 삼성전자라, 이 한 건이 흔들리면 비건설 실적이 크게 줄어든다.
